

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL ACAXOCHITLÁN
OFICIO No. PMA/DOP/ADM/009/2024
ACAXOCHITLÁN, HIDALGO A 16 DE ENERO DEL 2024

L.C. HECTOR GOMEZ ESPINOSA
SECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.
PRESENTE

AT'N: MTRA. NORMA OLIVIA LOZADA PEREZ
DIRECTORA GENERAL DE TESORERIA

POR MEDIO LE INFORMO A USTED, QUE LA CAPTURA DE LA INFORMACION EN EL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO REFERENTE AL REPORTE DEL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2023 SE ENCUENTRA CAPTURADA Y EN ESTATUS REVISION ENTIDAD FEDERATIVA.

ADJUNTO FOMATOS CON LA INFORMACION CAPTURADA PARA SU REVISION Y VALIDACION ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO CON LA SIGUIENTE INFORMACION:

- INFORMACION DE NIVEL FINANCIERO
- INFORMACION DE NIVEL PROYECTO

SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED AL PENDIENTE Y A SUS ORDENES.



C. ERIK CARBAJAL ROMO
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ACAXOCHITLÁN, HGO.



L.C. ELIAS AVILA RUIZ
TESORERO MUNICIPAL



FORMATO - 2

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
4TO. TRIMESTRE 2023

MUNICIPIO:

Ejercicio 2022					
Fondo	Ejercicio				
FAISM	1004	2023	\$107,357,507.00	\$85,170,438.66	\$85,170,438.66
FORTAMUN	1005	2023	\$41,351,619.00	\$41,203,943.88	\$41,203,943.88

\$148,709,126.00 \$148,709,126.00 \$148,709,126.00 \$126,522,057.66 \$126,374,382.54 \$126,374,382.54

(Registrar si es que existen años anteriores por terminar)

Fondo	Ejercicio (de 2013 a 2022)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
FAISM	2013										
FAISM	2014										
FORTAMUN	2014										
FAISM	2015										
FORTAMUN	2015										
FAISM	2016										
FORTAMUN	2016										
FAISM	2017										
FORTAMUN	2017										
FAISM	2018										
FORTAMUN	2018										
FAISM	2019										
FORTAMUN	2019										
FAISM	2020										
FORTAMUN	2020										
FAISM	2021										
FORTAMUN	2021										
FAISM	2022										
FORTAMUN	2022										

Favor de llenar este formato SOLO EL COLOR GRIS con importes que se van a registrar en el sistema a NIVEL FINANCIERO



*Para registrar en sistema

Aportaciones Federales	1004	FAISM	Ramo 33	*Registrar el numero de proyecto iniciando con año ejemplo: 2017-FAISM y numero, 2017-FAFM y numero, 2017-PRIF y número, 2016-FORTALCEBY
Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	Ramo 33	numero para identificar con facilidad a que ejercicio y fondo corresponde
Fidelcomiso	1004	PRIF (2016 y AÑOS ANTERIORES)	Ramo 23	
Subsidios	1032	FORTALCEBY (2016 y AÑOS ANTERIORES)	Ramo 23	
Subsidios	1030	Fortalecimiento Financiero (2016 y AÑOS ANTERIORES)	Ramo 23	




MUNICIPIO DE ACAHOCHITLAN (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición	3,835,000	0	3,835,000	5,756,249	5,756,249	1,921,249
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras	3,670,674	0	3,670,674	5,952,028	5,952,028	2,281,354
D. Derechos	797,000	0	797,000	834,290	834,290	37,290
E. Productos	1,670,000	0	1,670,000	297,663	297,663	-1,372,337
F. Aprovechamientos	0	0	0	225	225	225
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	63,522,698	13,597,321	77,120,019	81,514,695	81,514,695	17,991,997
(H1)+2*(H3)+4*(H5)+6*(H7)+8*(H9)+10*(H11)						
h1) Fondo General de Participaciones	41,040,585	10,326,378	51,366,963	49,297,165	49,297,165	8,256,580
h2) Fondo de Fomento Municipal	18,035,232	2,321,820	20,357,052	19,147,063	19,147,063	1,111,981
h3) Fondo de Fideicomiso y Recaudación	1,165,189	403,120	1,568,309	1,163,494	1,163,494	-1,695
h4) Fondo de Compensación	993,234	261,525	1,254,759	1,065,979	1,065,579	72,345
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	656,930	133,777	790,707	916,202	916,202	259,272
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo Gasolinas y Diésel	1,531,528	150,701	1,782,229	1,359,501	1,359,501	-272,027
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	4,545,061	4,545,061	4,545,061
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	4,020,631	4,020,631	4,020,631
1. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=-I1+2*I3+4*I5)	418,351	113,197	531,548	699,248	699,248	280,897
11) Tenencia o Uso de Vehículos						
12) Fondo de Compensación ISAN	67,879	8,645	76,524	76,602	76,602	8,723
13) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	350,472	104,552	455,024	622,646	622,646	272,174
14) Fondo de Compensación de Repuestos-Internados	0	0	0	0	0	0
15) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
K. Convenios y Asignaciones	400,000	0	400,000	0	0	-400,000
k1) Otros Convenios y Subsidios	400,000	0	400,000	0	0	-400,000
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=-L1+L2)	0	0	0	0	0	0
1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
L. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	74,313,723	13,710,518	88,024,241	95,054,397	95,054,397	20,740,674
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=-a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	119,049,852	29,659,274	148,709,126	150,860,728	150,860,728	31,735,449
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	84,919,028	22,438,479	107,357,507	107,429,693	107,429,693	22,510,665
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Teritoriales del Distrito Federal	34,130,824	7,220,795	41,351,619	41,354,860	41,354,860	7,224,036
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	2,000,748	2,000,748	2,000,748
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
a9) Convenios (B=-b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=-c1-c2)	0	0	0	0	0	0



MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LOF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Ingreso				Diferencia (e)
			Modificado	Devengado	Recaudado		
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos c2) Fondo Minero D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones. E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0 0 0 0				0 0 0 0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (I = A + B + C + D + E)	119,049,952	29,659,274	149,784,553	150,960,728	150,860,728	150,860,728	31,735,449
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	119,383,575	43,369,792	236,808,794	245,915,126	245,915,126	245,915,126	52,476,124
Datos Informativos 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)			0 0 0				0 0 0



Entidad	Municipio	Tipo de Regis	Ciclo de Recu	Tipo de Recur	Clave Ramo	Modalidad	Pograma pres	Programa Fon	Institucion Eje	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Minis	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
13	2	1	2023	2	33 I		5 FORTAMUN												
13	2	2	2023	2	33 I		5 FORTAMUN					113	17471791	\$ 16,108,225.63	\$ 16,108,225.63	\$ 16,108,225.63	\$ 16,108,225.63	\$ 16,108,225.63	\$ 16,108,225.63
13	2	2	2023	2	33 I		5 FORTAMUN					132	3088455.88	\$ 2,789,241.23	\$ 2,789,241.23	\$ 2,789,241.23	\$ 2,789,241.23	\$ 2,789,241.23	\$ 2,789,241.23
13	2	2	2023	2	33 I		5 FORTAMUN					133	150000	\$ 21,561.41	\$ 21,561.41	\$ 21,561.41	\$ 21,561.41	\$ 21,561.41	\$ 21,561.41
13	2	2	2023	2	33 I		5 FORTAMUN					134	150000	\$ 16,895.62	\$ 16,895.62	\$ 16,895.62	\$ 16,895.62	\$ 16,895.62	\$ 16,895.62
13	2	2	2023	2	33 I		5 FORTAMUN					152	1500000	\$ 1,271,265.42	\$ 1,271,265.42	\$ 1,271,265.42	\$ 1,271,265.42	\$ 1,271,265.42	\$ 1,271,265.42
13	2	2	2023	2	33 I		5 FORTAMUN					155	600000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	2	2	2023	2	33 I		5 FORTAMUN					218	200000	\$ 127,600.00	\$ 127,600.00	\$ 127,600.00	\$ 127,600.00	\$ 127,600.00	\$ 127,600.00
13	2	2	2023	2	33 I		5 FORTAMUN					221	100000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	2	2	2023	2	33 I		5 FORTAMUN					246	500000	\$ 148,000.00	\$ 148,000.00	\$ 148,000.00	\$ 148,000.00	\$ 148,000.00	\$ 148,000.00
13	2	2	2023	2	33 I		5 FORTAMUN					254	100000	\$ 68,038.00	\$ 68,038.00	\$ 68,038.00	\$ 68,038.00	\$ 68,038.00	\$ 68,038.00
13	2	2	2023	2	33 I		5 FORTAMUN					259	520000	\$ 301,868.70	\$ 301,868.70	\$ 301,868.70	\$ 301,868.70	\$ 301,868.70	\$ 301,868.70
13	2	2	2023	2	33 I		5 FORTAMUN					261	1800000	\$ 4,602,481.29	\$ 4,602,481.29	\$ 4,602,481.29	\$ 4,602,481.29	\$ 4,602,481.29	\$ 4,602,481.29
13	2	2	2023	2	33 I		5 FORTAMUN					271	1000000	\$ 999,848.08	\$ 999,848.08	\$ 999,848.08	\$ 999,848.08	\$ 999,848.08	\$ 999,848.08
13	2	2	2023	2	33 I		5 FORTAMUN					272	300000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	2	2	2023	2	33 I		5 FORTAMUN					291	100000	\$ 251,952.00	\$ 251,952.00	\$ 251,952.00	\$ 251,952.00	\$ 251,952.00	\$ 251,952.00
13	2	2	2023	2	33 I		5 FORTAMUN					296	500000	\$ 269,152.77	\$ 269,152.77	\$ 269,152.77	\$ 269,152.77	\$ 269,152.77	\$ 269,152.77
13	2	2	2023	2	33 I		5 FORTAMUN					298	250000	\$ 86,555.19	\$ 86,555.19	\$ 86,555.19	\$ 86,555.19	\$ 86,555.19	\$ 86,555.19
13	2	2	2023	2	33 I		5 FORTAMUN					311	2700000	\$ 4,464,466.77	\$ 4,464,466.77	\$ 4,464,466.77	\$ 4,464,466.77	\$ 4,455,812.59	\$ 4,455,812.59
13	2	2	2023	2	33 I		5 FORTAMUN					326	720000	\$ 1,002,240.00	\$ 1,002,240.00	\$ 1,002,240.00	\$ 1,002,240.00	\$ 1,002,240.00	\$ 1,002,240.00
13	2	2	2023	2	33 I		5 FORTAMUN					331	0	\$ 763,280.00	\$ 763,280.00	\$ 763,280.00	\$ 763,280.00	\$ 763,280.00	\$ 763,280.00
13	2	2	2023	2	33 I		5 FORTAMUN					332	0	\$ 493,000.00	\$ 493,000.00	\$ 493,000.00	\$ 493,000.00	\$ 493,000.00	\$ 493,000.00
13	2	2	2023	2	33 I		5 FORTAMUN					336	110548.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	2	2	2023	2	33 I		5 FORTAMUN					344	200000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	2	2	2023	2	33 I		5 FORTAMUN					355	410000	\$ 227,236.36	\$ 227,236.36	\$ 227,236.36	\$ 227,236.36	\$ 227,236.36	\$ 227,236.36
13	2	2	2023	2	33 I		5 FORTAMUN					357	180000	\$ 4,872.00	\$ 4,872.00	\$ 4,872.00	\$ 4,872.00	\$ 4,872.00	\$ 4,872.00
13	2	2	2023	2	33 I		5 FORTAMUN					358	1500000	\$ 1,353,913.53	\$ 1,353,913.53	\$ 1,353,913.53	\$ 1,353,913.53	\$ 1,258,254.59	\$ 1,258,254.59
13	2	2	2023	2	33 I		5 FORTAMUN					392	460000	\$ 235,472.00	\$ 235,472.00	\$ 235,472.00	\$ 235,472.00	\$ 192,110.00	\$ 192,110.00
13	2	2	2023	2	33 I		5 FORTAMUN					398	1640824	\$ 1,294,253.00	\$ 1,294,253.00	\$ 1,294,253.00	\$ 1,294,253.00	\$ 1,294,253.00	\$ 1,294,253.00
13	2	2	2023	2	33 I		5 FORTAMUN					541	4500000	\$ 4,440,000.00	\$ 4,440,000.00	\$ 4,440,000.00	\$ 4,440,000.00	\$ 4,440,000.00	\$ 4,440,000.00
13	2	2	2023	2	33 I		5 FORTAMUN					551	400000	\$ 10,200.00	\$ 10,200.00	\$ 10,200.00	\$ 10,200.00	\$ 10,200.00	\$ 10,200.00
13	2	2	2023	2	33 I		5 FORTAMUN					565	200000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
													\$ 41,351,619.00	\$ 41,351,619.00	\$ 41,351,619.00	\$ 41,351,619.00	\$ 41,203,943.88	\$ 41,203,943.88	



INFORME DEL 4TO TRIMESTRE 2023
DESTINO DEL GASTO



ÓRGANO RECTOR: MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN
 UNIDAD PRESUPUESTAL: 4
 NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: FORTAMUN
 ENCARGADO DEL FONDO: MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN
 EJERCICIO DEL RECURSO: 2023

DATOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO
 NOMBRE: CESAR CRUZ REYES
 CARGO: CONTADOR
 CORREO ELECTRÓNICO: ccr_18r5@hotmail.com
 TELÉFONO(S): 7752363430

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
 MINISTRACIONES DIRECTAS


FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O COBERTURA ESTATAL	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL						PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
				MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	CONPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
2023/FAPFM002300	Sueldos base al personal permanente	113	ACAXOCHITLAN	16108225.63	16108225.63	16108225.63	16108225.63	16108225.63	16108225.63	100%	
2023/FAPFM002301	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	132	ACAXOCHITLAN	2789241.23	2789241.23	2789241.23	2789241.23	2789241.23	2789241.23	100%	
2023/FAPFM002302	Horas extraordinarias	133	ACAXOCHITLAN	21561.41	21561.41	21561.41	21561.41	21561.41	21561.41	100%	
2023/FAPFM002303	Compensaciones	134	ACAXOCHITLAN	16895.62	16895.62	16895.62	16895.62	16895.62	16895.62	100%	
2023/FAPFM002304	Indemnizaciones	152	ACAXOCHITLAN	1271265.42	1271265.42	1271265.42	1271265.42	1271265.42	1271265.42	100%	
2023/FAPFM002314	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	218	ACAXOCHITLAN	127600	127600	127600	127600	127600	127600	100%	
2023/FAPFM002325	Material eléctrico y electrónico	246	ACAXOCHITLAN	148000	148000	148000	148000	148000	148000	100%	
2023/FAPFM002316	Materiales, accesorios y suministros médicos	254	ACAXOCHITLAN	68038	68038	68038	68038	68038	68038	100%	
2023/FAPFM002326	Otros productos químicos	259	ACAXOCHITLAN	301868.7	301868.7	301868.7	301868.7	301868.7	301868.7	100%	
2023/FAPFM002317	Combustibles lubricantes y aditivos	261	ACAXOCHITLAN	4602481.29	4602481.29	4602481.29	4602481.29	4602481.29	4602481.29	100%	
2023/FAPFM002318	Vestuario y uniformes	271	ACAXOCHITLAN	999848.08	999848.08	999848.08	999848.08	999848.08	999848.08	100%	
2023/FAPFM002320	Herramientas menores	291	ACAXOCHITLAN	251952	251952	251952	251952	251952	251952	0%	
2023/FAPFM002321	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	296	ACAXOCHITLAN	269152.77	269152.77	269152.77	269152.77	269152.77	269152.77	100%	
2023/FAPFM002322	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	298	ACAXOCHITLAN	86555.19	86555.19	86555.19	86555.19	86555.19	86555.19	100%	
2023/FAPFM002323	Energía Eléctrica	311	ACAXOCHITLAN	4464466.77	4464466.77	4464466.77	4464466.77	4455812.59	4455812.59	100%	
2023/FAPFM002306	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	326	ACAXOCHITLAN	1002240	1002240	1002240	1002240	1002240	1002240	100%	
2023/FAPFM002327	Servicios legales de contabilidad auditoría y relacionados	331	ACAXOCHITLAN	763280	763280	763280	763280	763280	763280	100%	
2023/FAPFM002327	Servicios de diseño arquitectura ingeniería y actividades relacionadas	332	ACAXOCHITLAN	493000	493000	493000	493000	493000	493000	0%	
2023/FAPFM002309	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	355	ACAXOCHITLAN	227236.36	227236.36	227236.36	227236.36	227236.36	227236.36	100%	
2023/FAPFM002310	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	357	ACAXOCHITLAN	4872	4872	4872	4872	4872	4872	100%	
2023/FAPFM002311	Servicio de limpieza y manejo de desechos	358	ACAXOCHITLAN	1353913.53	1353913.53	1353913.53	1353913.53	1258254.59	1258254.59	93%	
2023/FAPFM002312	Impuestos y derechos	392	ACAXOCHITLAN	235472	235472	235472	235472	192110	192110	82%	
2023/FAPFM002313	Impuestos sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	398	ACAXOCHITLAN	1294253	1294253	1294253	1294253	1294253	1294253	100%	
2023/FAPFM002328	vehículos y equipos terrestres	541	ACAXOCHITLAN	4440000	4440000	4440000	4440000	4440000	4440000	100%	
2023/FAPFM002329	equipo de defensa y seguridad	551	ACAXOCHITLAN	10200	10200	10200	10200	10200	10200	100%	
TOTAL				\$ 41,351,619.00	\$ 41,351,619.00	\$ 41,351,619.00	\$ 41,351,619.00	\$ 41,209,943.88	\$ 41,209,943.88	92%	

NOTA: EL FORMATO DEBE LLENARSE POR FONDO FEDERAL Y CIFRAS ACUMULADAS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE. EN CASO DE QUE UNA OBRA SE DESAGREGUE EN VARIOS FOLIOS AGREGAR SUBTÍTULOS POR OBRA. NO OMITO COMENTAR QUE EL DEBIDO REQUERIMIENTO DE ESTE FORMATO ES RESPONSABILIDAD DEL ENTE PÚBLICO QUE LO ELABORA.

ELABORÓ
CESAR CRUZ REYES

REVISÓ
ELIAS AVILA RUIZ

AUTORIZÓ
TECEN ADMON ERIK CARBALLO ROSA



4TO TRIMESTRE
EJERCICIO DEL GASTO



ÓRGANO RECTOR: MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN
UNIDAD PRESUPUESTAL: 4
NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: FORTAMUN
ENCARGADO DEL FONDO: MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN
EJERCICIO DEL RECURSO: 2023

DATOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO
NOMBRE: CESAR CRUZ REYES
CARGO: CONTADOR
CORREO ELECTRÓNICO: ccr_18r5@hotmail.com
TELÉFONO(S): 7752363430

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

MINISTRACIONES DIRECTAS



N°	TIPO DE GASTO	PARTIDA GENÉRICA	MUNICIPIO O COBERTURA ESTATAL	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL:							OBSERVACIONES
				APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
1	1	113	ACAXOCHITLAN	17471790.96	16108225.63	16108225.63	16108225.63	16108225.63	16108225.63	16108225.63	
2	1	132	ACAXOCHITLAN	3088455.88	2789241.23	2789241.23	2789241.23	2789241.23	2789241.23	2789241.23	
3	1	133	ACAXOCHITLAN	150000	21561.41	21561.41	21561.41	21561.41	21561.41	21561.41	
4	1	134	ACAXOCHITLAN	150000	16895.62	16895.62	16895.62	16895.62	16895.62	16895.62	
5	1	152	ACAXOCHITLAN	1500000	1271265.42	1271265.42	1271265.42	1271265.42	1271265.42	1271265.42	
6	1	155	ACAXOCHITLAN	600000	0	0	0	0	0	0	
7	1	218	ACAXOCHITLAN	200000	127600	127600	127600	127600	127600	127600	
8	1	221	ACAXOCHITLAN	100000	0	0	0	0	0	0	
9	1	246	ACAXOCHITLAN	500000	148000	148000	148000	148000	148000	148000	
10	1	254	ACAXOCHITLAN	100000	68038	68038	68038	68038	68038	68038	
11	1	259	ACAXOCHITLAN	520000	301868.7	301868.7	301868.7	301868.7	301868.7	301868.7	
12	1	261	ACAXOCHITLAN	1800000	4602481.29	4602481.29	4602481.29	4602481.29	4602481.29	4602481.29	
13	1	271	ACAXOCHITLAN	1000000	999848.08	999848.08	999848.08	999848.08	999848.08	999848.08	
14	1	272	ACAXOCHITLAN	300000	0	0	0	0	0	0	
15	1	291	ACAXOCHITLAN	100000	251952	251952	251952	251952	251952	251952	
16	1	296	ACAXOCHITLAN	500000	269152.77	269152.77	269152.77	269152.77	269152.77	269152.77	
17	1	298	ACAXOCHITLAN	250000	86555.19	86555.19	86555.19	86555.19	86555.19	86555.19	
18	1	311	ACAXOCHITLAN	2700000	4464466.77	4464466.77	4464466.77	4464466.77	4455812.59	4455812.59	
14	1	326	ACAXOCHITLAN	720000	1002240	1002240	1002240	1002240	1002240	1002240	
15	1	331	ACAXOCHITLAN	0	763280	763280	763280	763280	763280	763280	
16	1	332	ACAXOCHITLAN	0	493000	493000	493000	493000	493000	493000	
17	1	336	ACAXOCHITLAN	110548.16	0	0	0	0	0	0	
18	1	344	ACAXOCHITLAN	200000	0	0	0	0	0	0	
19	1	355	ACAXOCHITLAN	410000	227236.36	227236.36	227236.36	227236.36	227236.36	227236.36	
20	1	357	ACAXOCHITLAN	180000	4872	4872	4872	4872	4872	4872	
21	1	358	ACAXOCHITLAN	1500000	1353913.53	1353913.53	1353913.53	1353913.53	1258254.59	1258254.59	
22	1	392	ACAXOCHITLAN	460000	235472	235472	235472	235472	192110	192110	
23	1	398	ACAXOCHITLAN	1640824	1294253	1294253	1294253	1294253	1294253	1294253	
24	1	541	ACAXOCHITLAN	4500000	4440000	4440000	4440000	4440000	4440000	4440000	
25	1	551	ACAXOCHITLAN	400000	10200	10200	10200	10200	10200	10200	
TOTAL				\$ 41,151,619.00	\$ 41,351,619.00	\$ 41,351,619.00	\$ 41,351,619.00	\$ 41,351,619.00	\$ 41,203,943.88	\$ 41,203,943.88	


NOTA: EL FORMATO DEBE LLENARSE POR FONDO FEDERAL Y CIFRAS ACUMULADAS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.
NO OMITO COMENTAR QUE EL DEBIDO REQUERIMIENTO DE ESTE FORMATO ES RESPONSABILIDAD DEL ENTE PÚBLICO QUE LO ELABORA.

ELABORO
CESAR CRUZ REYES

REVISO
ELIAS AVILA RUIZ



AUTORIZO
TECENADMON ERIK CARBAL ROMO

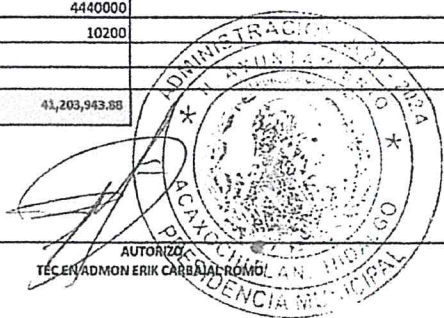



MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN
HIDALGO

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2023
F. Financiamiento: 05

Utr. cesar

Fecha y 02:35 p. m. 05/01/2024

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado
600000 INVERSION PUBLICA	\$84,919,028.00	\$22,474,669.83	\$107,393,697.83	\$102,553,139.76	\$4,840,558.05	\$85,170,438.66	\$17,382,701.12	\$22,223,259.17	\$85,170,438.66	\$85,170,438.66
610000 Obra pública en bienes de dominio público	\$84,919,028.00	\$11,159,669.83	\$98,078,697.83	\$92,213,139.76	\$3,865,558.05	\$74,335,520.50	\$17,877,619.28	\$21,743,177.33	\$74,335,520.50	\$74,335,520.50
612000 Edificación no habitacional	\$59,748,227.59	-\$57,133,692.44	\$2,614,545.15	\$2,614,545.15	\$0.00	\$0.00	\$2,614,545.15	\$2,614,545.15	\$0.00	\$0.00
612001 Edificación no habitacional	\$59,748,227.59	-\$59,748,227.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
612072 2023/FAISM00002072 Construcción de casa de Cultura	\$0.00	\$2,614,545.15	\$2,614,545.15	\$2,614,545.15	\$0.00	\$0.00	\$2,614,545.15	\$2,614,545.15	\$0.00	\$0.00
614000 División de terrenos y construcción de obras de	\$18,670,800.41	\$66,354,640.55	\$85,025,440.96	\$81,159,882.91	\$3,865,558.05	\$69,744,633.87	\$11,415,248.94	\$15,280,806.99	\$69,744,633.97	\$69,744,633.97
614001 División de terrenos y construcción de obras de	\$18,670,800.41	-\$18,670,800.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
614001 2023/FAISM002001 Pavimentación de concreto hidráulico	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00
614002 2023/FAISM002002 Pavimentación de concreto	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,399,999.99	\$0.01	\$0.01	\$1,399,999.99	\$1,399,999.99
614003 2023/FAISM002003 Pavimentación de concreto	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00
614004 2023/FAISM002004 Pavimentación de concreto	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00
614005 2023/FAISM002005 Pavimentación de concreto	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00
614006 2023/FAISM002006 Construcción de red eléctrica en	\$0.00	\$1,308,360.16	\$1,308,360.16	\$1,308,360.16	\$0.00	\$1,308,360.16	\$0.00	\$0.00	\$1,308,360.16	\$1,308,360.16
614007 2023/FAISM002007 Construcción de Red Eléctrica en	\$0.00	\$890,063.74	\$890,063.74	\$890,063.74	\$0.00	\$890,063.74	\$0.00	\$0.00	\$890,063.74	\$890,063.74
614008 2023/FAISM002008 Construcción de Red Eléctrica	\$0.00	\$1,678,051.49	\$1,678,051.49	\$1,678,051.49	\$0.00	\$1,678,051.49	\$0.00	\$0.00	\$1,678,051.49	\$1,678,051.49
614009 2023/FAISM002009 Ampliación de red de drenaje	\$0.00	\$955,200.00	\$955,200.00	\$955,200.00	\$0.00	\$955,200.00	\$0.00	\$0.00	\$955,200.00	\$955,200.00
614010 2023/FAISM002010 Pavimentación de concreto	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$899,999.98	\$0.02	\$0.02	\$899,999.98	\$899,999.98
614011 2023/FAISM002011 Pavimentación de concreto	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00
614012 2023/FAISM002012 Pavimentación de concreto	\$0.00	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00
614013 2023/FAISM00313 Ampliación de Red Eléctrica en la	\$0.00	\$1,012,118.62	\$1,012,118.62	\$1,012,118.62	\$0.00	\$1,012,118.62	\$0.00	\$0.00	\$1,012,118.62	\$1,012,118.62
614014 2023/FAISM002014 Construcción de red Eléctrica en	\$0.00	\$679,215.04	\$679,215.04	\$679,215.03	\$0.01	\$679,215.03	\$0.00	\$0.01	\$679,215.03	\$679,215.03
614015 2023/FAISM002015 Pavimentación de concreto	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00
614016 2023/FAISM002016 Pavimentación de concreto	\$0.00	\$1,998,299.98	\$1,998,299.98	\$1,998,299.98	\$0.00	\$1,998,299.99	-\$0.01	-\$0.01	\$1,998,299.99	\$1,998,299.99
614017 2023/FAISM002017 Pavimentación de concreto	\$0.00	\$1,699,999.99	\$1,700,000.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,699,999.99	\$0.01	\$0.01	\$1,699,999.99	\$1,699,999.99
614018 2023/FAISM002018 Pavimentación de concreto	\$0.00	\$342,740.80	\$342,740.80	\$342,740.80	\$0.00	\$342,740.80	\$0.00	\$0.00	\$342,740.80	\$342,740.80
614019 2023/FAISM002019 Pavimentación de concreto	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00
614020 2023/FAISM002020 Pavimentación de concreto hidráulico	\$0.00	\$2,100,000.00	\$2,100,000.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$2,100,000.00
614021 2023/FAISM002021 Pavimentación de concreto	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00
614022 2023/FAISM002022 Pavimentación de concreto	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00
614023 2023/FAISM002023 Pavimentación de concreto hidráulico	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
614024 2023/FAISM002024 Pavimentación de concreto	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
614025 2023/FAISM002025 Pavimentación de concreto	\$0.00	\$3,375,000.00	\$3,375,000.00	\$3,375,000.00	\$0.00	\$3,375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375,000.00	\$3,375,000.00
614026 2023/FAISM002026 Construcción de red eléctrica en La	\$0.00	\$1,142,042.64	\$1,142,042.64	\$1,142,042.64	\$0.00	\$1,142,042.64	\$0.00	\$0.00	\$1,142,042.64	\$1,142,042.64
614027 2023/FAISM002027 Construcción de red eléctrica en la	\$0.00	\$1,335,986.58	\$1,335,986.58	\$1,335,986.58	\$0.00	\$1,335,986.58	\$0.00	\$0.00	\$1,335,986.58	\$1,335,986.58
614028 2023/FAISM002028 Construcción de red de drenaje	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00

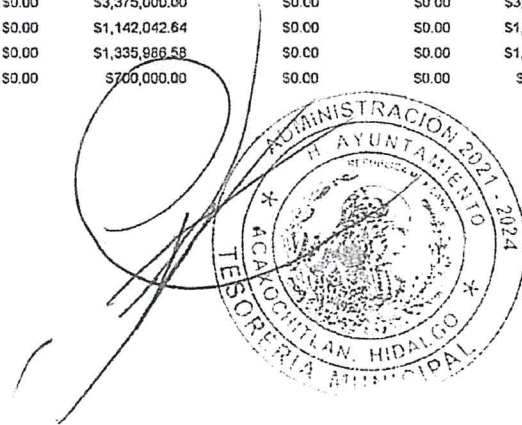

Página

MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN
HIDALGO

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2023

F. Financiamiento: 05

Fecha y 09/ene./2024

Usu: cesar

hora de 02:35 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado
614329 2023/FAISM002029 Pavimentación de concreto	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,299,999.99	\$0.01	\$0.01	\$1,299,999.99	\$1,299,999.99
614330 2023/FAISM002030 Construcción de red eléctrica en	\$0.00	\$1,294,624.13	\$1,294,624.13	\$1,294,624.13	\$0.00	\$1,294,624.13	\$0.00	\$0.00	\$1,294,624.13	\$1,294,624.13
614331 2023/FAISM002031 Construcción de red eléctrica Col.	\$0.00	\$1,401,451.22	\$1,401,451.22	\$1,401,451.22	\$0.00	\$1,401,451.22	\$0.00	\$0.00	\$1,401,451.22	\$1,401,451.22
614332 2023/FAISM002032 Construcción de red eléctrica en	\$0.00	\$2,075,465.55	\$2,075,465.55	\$2,075,465.55	\$0.00	\$2,075,465.55	\$0.00	\$0.00	\$2,075,465.55	\$2,075,465.55
614333 2023/FAISM002033 Construcción de Red Eléctrica en	\$0.00	\$1,184,296.50	\$1,184,296.50	\$1,184,296.50	\$0.00	\$1,184,296.50	\$0.00	\$0.00	\$1,184,296.50	\$1,184,296.50
614334 2023/FAISM002034 Construcción de techado en Esc.	\$0.00	\$1,997,984.00	\$1,997,984.00	\$1,997,984.00	\$0.00	\$1,997,984.00	\$0.00	\$0.00	\$1,997,984.00	\$1,997,984.00
614336 2023/FAISM002036 Aportación Municipal para	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
614337 2023/FAISM002037 Construcción de red eléctrica en la	\$0.00	\$1,300,564.51	\$1,300,564.51	\$1,300,564.51	\$0.00	\$1,300,564.51	\$0.00	\$0.00	\$1,300,564.51	\$1,300,564.51
614338 2023/FAISM002038 Construcción de red eléctrica en Col.	\$0.00	\$1,091,533.36	\$1,091,533.36	\$1,091,533.36	\$0.00	\$1,091,533.36	\$0.00	\$0.00	\$1,091,533.36	\$1,091,533.36
614339 2023/FAISM002039 Construcción de red eléctrica en la	\$0.00	\$712,280.17	\$712,280.17	\$0.00	\$712,280.17	\$0.00	\$0.00	\$712,280.17	\$0.00	\$0.00
614340 2023/FAISM002040 Pavimentación de concreto hidráulico	\$0.00	\$1,020,496.56	\$1,020,496.56	\$1,020,496.56	\$0.00	\$1,020,496.56	\$0.00	\$0.00	\$1,020,496.56	\$1,020,496.56
614341 2023/FAISM002041 Construcción de ampliación de	\$0.00	\$1,016,768.32	\$1,016,768.32	\$1,016,768.32	\$0.00	\$1,016,768.32	\$0.00	\$0.00	\$1,016,768.32	\$1,016,768.32
614342 2023/FAISM002042 Construcción de guarniciones y	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
614343 2023/FAISM002043 Pavimentación de concreto	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00
614344 2023/FAISM002044 Ampliación de red eléctrica a base	\$0.00	\$1,766,100.00	\$1,766,100.00	\$1,766,100.00	\$0.00	\$1,766,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,766,100.00	\$1,766,100.00
614345 2023/FAISM002045 Construcción de guarniciones y	\$0.00	\$625,000.00	\$625,000.00	\$625,000.00	\$0.00	\$625,000.00	\$0.00	\$0.00	\$625,000.00	\$625,000.00
614347 2023/FAISM002047 Pavimentación de concreto hidráulico	\$0.00	\$2,014,000.00	\$2,014,000.00	\$2,014,000.00	\$0.00	\$2,014,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,014,000.00	\$2,014,000.00
614348 2023/FAISM002048 Ampliación de pavimentación de	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
614349 2023/FAISM002049 Construcción de red eléctrica en la	\$0.00	\$1,186,165.96	\$1,186,165.96	\$1,186,165.96	\$0.00	\$1,186,165.96	\$0.00	\$0.00	\$1,186,165.96	\$1,186,165.96
614350 2023/FAISM002050 Construcción de red eléctrica en la	\$0.00	\$644,489.97	\$644,489.97	\$644,489.97	\$0.00	\$644,489.97	\$0.00	\$0.00	\$644,489.97	\$644,489.97
614352 2023/FAISM002052 Construcción de cunetas de concreto	\$0.00	\$222,000.00	\$222,000.00	\$222,000.00	\$0.00	\$222,000.00	\$0.00	\$0.00	\$222,000.00	\$222,000.00
614353 2023/FAISM002053 Construcción de cunetas en Camino	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$657,326.12	\$342,673.88	\$342,673.88	\$657,326.12	\$657,326.12
614354 2023/FAISM002054 Construcción de red eléctrica en	\$0.00	\$1,090,350.41	\$1,090,350.41	\$0.00	\$1,090,350.41	\$0.00	\$0.00	\$1,090,350.41	\$0.00	\$0.00
614355 2023/FAISM002055 Construcción de sistema de agua	\$0.00	\$301,400.00	\$301,400.00	\$301,400.00	\$0.00	\$301,400.00	\$0.00	\$0.00	\$301,400.00	\$301,400.00
614356 2023/FAISM002056 Construcción de red de drenaje	\$0.00	\$615,000.00	\$615,000.00	\$615,000.00	\$0.00	\$615,000.00	\$0.00	\$0.00	\$615,000.00	\$615,000.00
614357 2023/FAISM002057 Pavimentación de concreto	\$0.00	\$837,000.00	\$837,000.00	\$837,000.00	\$0.00	\$0.00	\$837,000.00	\$837,000.00	\$0.00	\$0.00
614358 2023/FAISM002058 Pavimentación de concreto	\$0.00	\$1,363,000.00	\$1,363,000.00	\$1,246,000.00	\$117,000.00	\$939,626.52	\$306,373.48	\$423,373.48	\$939,626.52	\$839,626.52
614360 2023/FAISM002060 Construcción de red eléctrica en el	\$0.00	\$474,402.45	\$474,402.45	\$0.00	\$474,402.45	\$0.00	\$0.00	\$474,402.45	\$0.00	\$0.00
614361 2023/FAISM002061 Construcción de red eléctrica en la	\$0.00	\$556,937.14	\$556,937.14	\$0.00	\$556,937.14	\$0.00	\$0.00	\$556,937.14	\$0.00	\$0.00
614362 2023/FAISM002062 Construcción de red eléctrica en la	\$0.00	\$525,275.87	\$525,275.87	\$0.00	\$525,275.87	\$0.00	\$0.00	\$525,275.87	\$0.00	\$0.00
614363 2023/FAISM002063 Construcción de sistema de agua	\$0.00	\$200,500.00	\$200,500.00	\$200,500.00	\$0.00	\$200,500.00	\$0.00	\$0.00	\$200,500.00	\$200,500.00
614365 2023/FAISM002065 Construcción de red de drenaje	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$234,314.22	\$65,685.78	\$65,685.78	\$234,314.22	\$234,314.22
614366 2023/FAISM002066 Construcción de red de drenaje	\$0.00	\$960,000.00	\$960,000.00	\$776,000.00	\$184,000.00	\$634,011.00	\$141,989.00	\$325,989.00	\$634,011.00	\$634,011.00
614368 2023/FAISM002068 Rehabilitación de línea de	\$0.00	\$1,178,000.00	\$1,178,000.00	\$1,178,000.00	\$0.00	\$1,178,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,178,000.00	\$1,178,000.00
614369 2023/FAISM002069 Construcción de drenaje sanitario	\$0.00	\$197,000.00	\$197,000.00	\$168,688.00	\$38,312.00	\$122,675.14	\$36,012.86	\$74,324.86	\$122,675.14	\$122,675.14

Pa



MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN
HIDALGO

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2023
F. Financiamiento: 05

Fecha y 02:35 p. m. US/1
p. 2

Utr. cesar

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto		Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	
				Comprometido	Disponible para Comprometer					
61470 2023/FAISM002070 Ampliación de red de drenaje	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00	
61471 2023/FAISM002071 Construcción de cuartos domitorios	\$0.00	\$1,499,000.00	\$1,499,000.00	\$1,499,000.00	\$0.00	\$353,761.89	\$1,145,238.11	\$353,761.89	\$353,761.89	
61473 2023/FAISM002073 Construcción de guarrieros,	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,333,000.00	\$167,000.00	\$0.00	\$2,333,000.00	\$0.00	\$0.00	
61474 2023/FAISM002074 Ampliación de red de distribución	\$0.00	\$2,008,275.79	\$2,008,275.79	\$2,008,275.79	\$0.00	\$0.00	\$2,008,275.79	\$0.00	\$0.00	
61475 2023/FAISM002075 Construcción de tanque de	\$0.00	\$1,756,000.00	\$1,756,000.00	\$1,756,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,756,000.00	\$0.00	\$0.00	
61477 2023/FAISM002077 Rehabilitación de Unidad Deportiva	\$0.00	\$443,000.00	\$443,000.00	\$443,000.00	\$0.00	\$0.00	\$443,000.00	\$0.00	\$0.00	
61479 2023/FAISM002079 Construcción de cancha de futbol	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	
61500 Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$1,456,000.00	\$1,456,000.00	\$1,456,000.00	\$0.00	\$1,456,000.00	\$0.00	\$1,456,000.00	\$1,456,000.00	
61551 2023/FAISM002051 Revestimiento camino principal La	\$0.00	\$693,000.00	\$693,000.00	\$693,000.00	\$0.00	\$693,000.00	\$0.00	\$693,000.00	\$693,000.00	
61559 2023/FAISM002059 Revestimiento de camino principal	\$0.00	\$763,000.00	\$763,000.00	\$763,000.00	\$0.00	\$763,000.00	\$0.00	\$763,000.00	\$763,000.00	
61500 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos	\$6,500,000.00	\$482,711.72	\$6,982,711.72	\$6,982,711.72	\$0.00	\$3,134,886.53	\$3,847,825.19	\$3,134,886.53	\$3,134,886.53	
61501 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos	\$6,500,000.00	\$6,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
61535 2023/FAISM002035 Rehabilitación (impermeabilizante)	\$0.00	\$1,839,126.80	\$1,839,126.80	\$1,839,126.80	\$0.00	\$1,838,604.90	\$521.90	\$1,838,604.90	\$1,838,604.90	
61564 2023/FAISM002084 Rehabilitación de Escuela Pimiana	\$0.00	\$1,499,061.92	\$1,499,061.92	\$1,499,061.92	\$0.00	\$1,296,281.63	\$202,780.29	\$1,296,281.63	\$1,296,281.63	
61576 2023/FAISM002076 Rehabilitación, impermeabilizante y	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	
61578 2023/FAISM002078 Rehabilitación de Escuela	\$0.00	\$2,144,523.00	\$2,144,523.00	\$2,144,523.00	\$0.00	\$0.00	\$2,144,523.00	\$0.00	\$0.00	
62000 Obra pública en bienes propios	\$0.00	\$11,316,000.00	\$11,316,000.00	\$10,340,000.00	\$975,000.00	\$10,834,918.18	-\$484,918.16	\$480,081.84	\$10,834,918.16	\$10,834,918.16
62000 Edificación no habitacional	\$0.00	\$415,000.00	\$415,000.00	\$340,000.00	\$75,000.00	\$270,394.36	\$69,605.64	\$144,605.64	\$270,394.36	\$270,394.36
62067 2023/FAISM002067 Rehabilitación de Centro de Atención	\$0.00	\$415,000.00	\$415,000.00	\$340,000.00	\$75,000.00	\$270,394.36	\$69,605.64	\$144,605.64	\$270,394.36	\$270,394.36
62400 División de terrenos y construcción de obras de	\$0.00	\$10,900,000.00	\$10,900,000.00	\$10,000,000.00	\$900,000.00	\$10,564,523.80	-\$564,523.80	\$335,476.20	\$10,564,523.80	\$10,564,523.80
62446 2023/FAISM002046 Remodelación de explanada cívica	\$0.00	\$10,900,000.00	\$10,900,000.00	\$10,000,000.00	\$900,000.00	\$10,564,523.80	-\$564,523.80	\$335,476.20	\$10,564,523.80	\$10,564,523.80
Total	\$84,919,028.00	\$22,474,669.83	\$107,393,697.83	\$102,553,139.78	\$4,840,558.05	\$85,170,438.66	\$17,382,701.12	\$22,223,259.17	\$85,170,438.66	\$85,170,438.66



Pa:

CUARTO INFORME DEL 2023
EJERCICIO DEL GASTO

FEG

ÓRGANO RECTOR: GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
 UNIDAD PRESUPUESTAL: MUNICIPIO DE ACAXOCHITLÁN HIDALGO
 NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ENCARGADO DEL FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 EJERCICIO DEL RECURSO: 2023

DATOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO
 NOMBRE: ING. HUGO LÓPEZ VARGAS
 CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ACAXOCHITLÁN
 CORREO ELECTRÓNICO: obraspublicas@acaxochitlan.hgo.gob.mx
 TELÉFONO(S): 7712193758

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
MINISTRACIONES DIRECTAS



Nº	TIPO DE GASTO	PARTIDA GENÉRICA	MUNICIPIO O COBERTURA ESTATAL	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL:						OBSERVACIONES	
				APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO
1	2-GASTO DE INVERSION	611- OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN HGO	107357507.00	107357507.00	107357507.00	107357507.00	85170438.66	85170438.66	85170438.66	
1	2-GASTO DE INVERSION	612- EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN HGO	0	65296184.11	65296184.11	65296184.11	65296184.1	65296184.1	65296184.1	
2	2-GASTO DE INVERSION	614- DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN HGO	0	35561322.89	35561322.89	35561322.89	19874254.56	19874254.56	19874254.56	
4	2-GASTO DE INVERSION	619- TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIÓN Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	MUNICIPIO DE ACAXOCHITLAN HGO	0	6500000	6500000	6500000	0	0	0	
TOTAL				\$ -	\$ 107,357,507.00	\$ 107,357,507.00	\$ 107,357,507.00	\$ 85,170,438.66	\$ 85,170,438.66	\$ 85,170,438.66	

NOTA: EL FORMATO DEBE LLENARSE POR FONDO FEDERAL Y CIFRAS ACUMULADAS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.
NO OMITO COMENTAR QUE EL DEBIDO REQUERIMIENTO DE ESTE FORMATO ES RESPONSABILIDAD DEL ENTE PÚBLICO QUE LO ELABORA.

OSCAR IVÁN ZAPOTILLA SUÁREZ
 TITULAR DE OBRAS ADMINISTRATIVAS DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAXOCHITLÁN HGO

REVISÓ
 ING. HUGO LÓPEZ VARGAS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAXOCHITLÁN HIDALGO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AUTORIZÓ
 C. ERIC CARBALAL ROMO
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ACAXOCHITLÁN HGO

CUARTO INFORME DEL 2023
DESTINO DEL GASTO




ÓRGANO RECTOR: GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
 UNIDAD PRESUPUESTAL: MUNICIPIO DE ACAXOCHITLÁN HIDALGO
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ENCARGADO DEL FONDO:
 EJERCICIO DEL RECURSO: 2023

DATOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO
 NOMBRE: ING. HUGO LÓPEZ VARGAS
 CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE ACAXOCHITLÁN
 CORREO ELECTRÓNICO: obraspublicas.acw@gmail.com
 TELÉFONO(S): 7712193758

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
 MINISTRACIONES DIRECTAS



N°	TIPO DE GASTO	PARTIDA GENÉRICA	MUNICIPIO O COBERTURA ESTATAL	MONTOS DE RECURSO PRESUPUESTAL							OBSERVACIONES
				APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
1	2-GASTO DE INVERSIÓN	611-OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	MUNICIPIO DE ACAXOCHITLÁN HGO	107357507.00	107357507.00	107357507.00	107357507.00	85170438.66	85170438.66	85170438.66	
1	2-GASTO DE INVERSIÓN	612-EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	MUNICIPIO DE ACAXOCHITLÁN HGO	0	65296184.11	65296184.11	65296184.11	65296184.11	65296184.11	65296184.11	
2	2-GASTO DE INVERSIÓN	614-DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	MUNICIPIO DE ACAXOCHITLÁN HGO	0	35561322.89	35561322.89	35561322.89	19874254.56	19874254.56	19874254.56	
4	2-GASTO DE INVERSIÓN	619-TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIÓN Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	MUNICIPIO DE ACAXOCHITLÁN HGO	0	6500000	6500000	6500000	0	0	0	
TOTAL				\$	\$ 107,357,507.00	\$ 107,357,507.00	\$ 107,357,507.00	\$ 85,170,438.66	\$ 85,170,438.66	\$ 85,170,438.66	



NOTA: EL FORMATO DEBE LLENARSE POR FONDO FEDERAL Y CIFRAS ACUMULADAS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.
 NO OMITIR COMENTAR QUE EL DEBIDO REQUERIMIENTO DE ESTE FORMATO ES RESPONSABILIDAD DEL ENTE PÚBLICO QUE LO ELABORA.

[Signature]
 ELABORO
 DR. OSCAR IVÁN ZAPOTILLA SUAREZ
 TITULAR DE OBRAS ADMINISTRATIVAS DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAXOCHITLÁN HGO

[Signature]
 REVISÓ
 ING. HUGO LÓPEZ VARGAS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAXOCHITLÁN HIDALGO


[Signature]
 AUTORIZO
 C. ERIK CARBAJAL ROMO
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ACAXOCHITLÁN HGO

54	HD23030224003	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE ACQUERIALIA PUENTE Y FANFADE ACCESO AL RIO EN CASO DE TUMAMOLDA - 140835	2023FA15A000041	MUNICIPIO DE ACAHOCHTLAN HIDALGO	\$ 1,016,761.32	\$ 1,016,761.32	\$ 1,016,761.32	\$ 1,016,761.32	\$ 1,016,761.32	\$ 1,016,761.32	100%
55	HD23030224004	PAVIMENTACION DE CONCRETO HECHADO EN CALLE LAS FLORES EN EL BARRIO LA LATA, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA EDVDA - 141567	2023FA15A000000	MUNICIPIO DE ACAHOCHTLAN HIDALGO	\$ 2,100,000.00	\$ 2,100,000.00	\$ 2,100,000.00	\$ 2,100,000.00	\$ 2,100,000.00	\$ 2,100,000.00	100%
56	HD23030224005	PAVIMENTACION DE CONCRETO HECHADO EN CALLE REVOLUCION PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PARIOTLES - 140411	2023FA15A000000	MUNICIPIO DE ACAHOCHTLAN HIDALGO	\$ 3,375,000.00	\$ 3,375,000.00	\$ 3,375,000.00	\$ 3,375,000.00	\$ 3,375,000.00	\$ 3,375,000.00	100%
57	HD23030224006	PAVIMENTACION DE CONCRETO HECHADO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLUACHILCO - 141576	2023FA15A000000	MUNICIPIO DE ACAHOCHTLAN HIDALGO	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	100%
58	HD23030224007	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICIDAD EN CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLUACHILCO - ACAHOCHTLAN HIDALGO - 221664	2023FA15A000004	MUNICIPIO DE ACAHOCHTLAN HIDALGO	\$ 1,093,356.41	\$ 1,093,356.41	\$ 1,093,356.41	\$ -	\$ -	\$ -	100%
59	HD23030224008	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR AL BARRIO TLUACHILCO - 221315	2023FA15A000000	MUNICIPIO DE ACAHOCHTLAN HIDALGO	\$ 615,000.00	\$ 615,000.00	\$ 615,000.00	\$ 615,000.00	\$ 615,000.00	\$ 615,000.00	100%
60	HD23030224009	CONSTRUCCION DE TAPAJOTE DE ESTACION PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL TEODOTAL - 140672	2023FA15A000000	MUNICIPIO DE ACAHOCHTLAN HIDALGO	\$ 1,756,000.00	\$ 1,756,000.00	\$ 1,756,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	40%
61	HD23030224010	REPARACION DE ESTACION TELECOMUNICACIONES PARA BENEFICIAR AL BARRIO TLUACHILCO - 141576	2023FA15A000000	MUNICIPIO DE ACAHOCHTLAN HIDALGO	\$ 2,144,527.00	\$ 2,144,527.00	\$ 2,144,527.00	\$ -	\$ -	\$ -	30%
62	HD23030224011	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR AL BARRIO ATENCION EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLUACHILCO - 43929	2023FA15A000000	MUNICIPIO DE ACAHOCHTLAN HIDALGO	\$ 355,200.00	\$ 355,200.00	\$ 355,200.00	\$ 355,200.00	\$ 355,200.00	\$ 355,200.00	100%
63	HD23030224012	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICIDAD EN BARRIO LAJUNTA EL OCHO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLUACHILCO - ACAHOCHTLAN HIDALGO - 43932	2023FA15A000004	MUNICIPIO DE ACAHOCHTLAN HIDALGO	\$ 679,215.04	\$ 679,215.04	\$ 679,215.04	\$ 679,215.04	\$ 679,215.04	\$ 679,215.04	100%
64	HD23030224013	PAVIMENTACION DE CONCRETO HECHADO EN CALLE REVOLUCION PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL TEODOTAL - 140678	2023FA15A000000	MUNICIPIO DE ACAHOCHTLAN HIDALGO	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	100%
65	HD23030224014	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICIDAD EN CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE LA EDVDA, ACAHOCHTLAN HIDALGO - 147742	2023FA15A000000	MUNICIPIO DE ACAHOCHTLAN HIDALGO	\$ 1,401,451.22	\$ 1,401,451.22	\$ 1,401,451.22	\$ 1,401,451.22	\$ 1,401,451.22	\$ 1,401,451.22	100%
66	HD23030224015	CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO PARTE 2, ACAHOCHTLAN HIDALGO - 200154	2023FA15A000004	MUNICIPIO DE ACAHOCHTLAN HIDALGO	\$ 1,116,165.96	\$ 1,116,165.96	\$ 1,116,165.96	\$ 1,116,165.96	\$ 1,116,165.96	\$ 1,116,165.96	100%
67	HD23030224016	CONSTRUCCION DE CASAS DE CONCRETO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLUACHILCO - 221340	2023FA15A000000	MUNICIPIO DE ACAHOCHTLAN HIDALGO	\$ 222,000.00	\$ 222,000.00	\$ 222,000.00	\$ 222,000.00	\$ 222,000.00	\$ 222,000.00	100%
68	HD23030224017	CONSTRUCCION DE GUARDAFUERTE Y MANGUERA PARA BENEFICIAR AL BARRIO DORADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLUACHILCO - 222719	2023FA15A000000	MUNICIPIO DE ACAHOCHTLAN HIDALGO	\$ 625,000.00	\$ 625,000.00	\$ 625,000.00	\$ 625,000.00	\$ 625,000.00	\$ 625,000.00	100%
69	HD23030224018	PAVIMENTACION DE CONCRETO HECHADO EN CASO DE AGUA CALIENTE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BARRIO TLUACHILCO - 213925	2023FA15A000004	MUNICIPIO DE ACAHOCHTLAN HIDALGO	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	100%
70	HD23030224019	REVESTIMIENTO DE CASAS DE PUEBLO QUE SE ENCUENTRAN EN EL BARRIO TLUACHILCO - 221879	2023FA15A000000	MUNICIPIO DE ACAHOCHTLAN HIDALGO	\$ 703,000.00	\$ 703,000.00	\$ 703,000.00	\$ 703,000.00	\$ 703,000.00	\$ 703,000.00	100%
71	HD23030224020	REVESTIMIENTO DE CASAS DE PUEBLO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLUACHILCO - 221879	2023FA15A000000	MUNICIPIO DE ACAHOCHTLAN HIDALGO	\$ 630,000.00	\$ 630,000.00	\$ 630,000.00	\$ 630,000.00	\$ 630,000.00	\$ 630,000.00	100%
72	HD23030224021	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCION, BARRIO EN CALLE CENTRO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLUACHILCO - 317158	2023FA15A000000	MUNICIPIO DE ACAHOCHTLAN HIDALGO	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 214,314.22	\$ 214,314.22	\$ 214,314.22	100%
73	HD23030224022	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TUMAMOLDA - 221213	2023FA15A000000	MUNICIPIO DE ACAHOCHTLAN HIDALGO	\$ 200,500.00	\$ 200,500.00	\$ 200,500.00	\$ 200,500.00	\$ 200,500.00	\$ 200,500.00	100%
74	HD23030224023	PAVIMENTACION DE CONCRETO HECHADO EN CALLE LAS DONCELAS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLUACHILCO - 41673	2023FA15A000000	MUNICIPIO DE ACAHOCHTLAN HIDALGO	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	100%
75	HD23030224024	PAVIMENTACION DE CONCRETO HECHADO EN CALLE REVOLUCION PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLUACHILCO - 41567	2023FA15A000000	MUNICIPIO DE ACAHOCHTLAN HIDALGO	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	100%
76	HD23030224025	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICIDAD EN CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLUACHILCO - 41422	2023FA15A000000	MUNICIPIO DE ACAHOCHTLAN HIDALGO	\$ 891,063.74	\$ 891,063.74	\$ 891,063.74	\$ 891,063.74	\$ 891,063.74	\$ 891,063.74	100%
77	HD23030224026	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICIDAD EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO PARTE 2, ACAHOCHTLAN HIDALGO - 227548	2023FA15A000000	MUNICIPIO DE ACAHOCHTLAN HIDALGO	\$ 644,423.97	\$ 644,423.97	\$ 644,423.97	\$ 644,423.97	\$ 644,423.97	\$ 644,423.97	100%
78	HD23030224027	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLUACHILCO - 227605	2023FA15A000000	MUNICIPIO DE ACAHOCHTLAN HIDALGO	\$ 122,815.14	\$ 122,815.14	\$ 122,815.14	\$ 122,815.14	\$ 122,815.14	\$ 122,815.14	100%
79	HD23030224028	APORTACION MUNICIPAL PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE TEPIC (SAN PEDRO TLUACHILCO) ACAHOCHTLAN	2023FA15A000000	MUNICIPIO DE ACAHOCHTLAN HIDALGO	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100%
TOTAL					\$ 107,383,697.83	\$ 107,383,697.83	\$ 107,383,697.83	\$ 25,170,438.86	\$ 85,170,438.86	\$ 85,170,438.86	

NOTA: EL PRESUPUESTO DEBE ELABORARSE POR FONDO FEDERAL Y OTRAS ASIGNACIONES AL TERCER SECTOR CORRESPONDIENTE EN CASO DE QUE UNA O MÁS DE LAS FUENTES DE INGRESOS FUERAN RESTRINGIDAS POR OTRAS FUENTES. NO DEBE COMENTARSE EL DEBIDO REQUERIMIENTO DE ESTE FONDO EN LAS CUENTAS DEL ENTE PÚBLICO QUE LO TRABAJA.

ELABORÓ
 ING. OSCAR IVÁN ZAPOTILLA RAMÍREZ
 TITULAR DE OFICINA ADMINISTRATIVA DE CUENTAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAHOCHTLAN HIDALGO

REVISÓ
 ING. JESÚS LÓPEZ VILLALBA
 DIRECTOR DE OFICINA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ACAHOCHTLAN HIDALGO



Entidad	Municipio	Tipo de Regis	Ciclo de Recu	Tipo de Recur	Clave Ramo	Modalidad	Programa pres	Programa For	Institucion Eji	Rendimiento	ReIntegro	Tipo de Gasc	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
13	2	1	2023	2	33 I		4 FAIS		1					107357507	107357507	107357507	107357507	85170438.66	85170438.66	85170438.66			

